2.3.6 Calendarul activităților (revizuit Decembrie 2010)

Nr. Crt.	Activitatea/Subactivitatea	Pozitia/ persoana responsabila cu implementarea activitatii
A	**Activitati derulate inainte de depunerea Cererii de Finantare a proiectului**	MLPDL Proiectant CL Arad
1	**Atribuirea contractului de servicii de proiectare, in contextul HG nr. 811/2006**	MDLPL
	Actualizare/revizuirea studiului de de fezabilitate si studii anexe, obtinere avize/acorduri	Proiectant
	Elaborare Proiect Tehnic	Proiectant
	Elaborare Caiete de Sarcini, Detalii de executie, obtinere Autorizatie de Constructie	Proiectant
	Depunerea Cererii de finantare si anexelor aferente, in cadrul POR Axa prioritara 5 Domeniul major de interventie 5.1	Consiliul Local Arad
	Verificare conformitate administrativa	OI
	Verificare eligibilitate	OI
	Evaluare tehnica si financiara	Comisie evaluare
	Evaluare strategica	CRESC
	Conditii pre-contractuale - verificarea Proiectului Tehnic	OI
B	**Activitati de intreprins dupa semnarea contractului de finantare**	
1.	**Semnarea Contractului de finantare si demararea proiectului**	AMPOR/OI/Municipiul Arad - repr. Legal
2.	**Organizarea procedurilor de achizitii pentru atribuirea contractului de servicii consultanta si supervizare**	UIP responsabil achizitii publice
3.	**Organizarea procedurilor de achizitii pentru atribuirea contractului de lucrari de reabilitare a obiectivelor de patrimoniu - monumente istorice**	UIP manager de proiect resp. achizitii publice resp. tehnic Consultant
4.	**Promovarea si publicitatea proiectului**	UIP
4.1	***Publicitatea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuala***	
	Realizarea si amplasarea panourilor temporate	
	Realizarea si amplasarea placilor permanente	
4.2	***Promovarea proiectului***	
	Communicate/articole in presa locala	
	Conferinta de presa la semnarea contractului de lucrari	
	Conceptie si editare pliante, brosuri, CD-uri de prezentare	
	Eveniment de inaugurare a obiectivelor reabilitate si conferinta de presa	
	Informare finala asupra rezultatelor finale in ziarul local cu cea mai mare audienta	
5.*	**Desfasurare lucrari de reabilitare, restaurare si consolidare**	Constructor
5.1	**Lucrari de reabilitare la Podul Traian**	Constructor
5.1.1	Lucrari pregatitoare	
5.1.2	Lucrari de consolidare a infrastructurii	
5.1.3	Realizarea schelei de consolidare a tablierelor sub trafic cu restrictie de viteza de max 10km/h)	
5.1.4	Consolidarea tablierului independent (in inchidere de circulatie)	
5.1.5	Consolidarea tablierelor cu console (in inchidere de circulatie)	
5.1.6	Refacerea legaturilor dintre tablierul independent si capetele consolelor adiacente, inclusiv refacerea elementelor ornamentale (subt trafic cu restrictie de viteza de max 10km/h)	
5.1.7	Pregatirea tablierului pentru darea lui in exploatare	
5.1.8	Desfiintarea platformlor drumurilor de acces si a organizarii de santier inclusiv reamplasarea retelelor utilitare pe pod si protejarea lor	
5.2	**Lucrari de reabilitare la sistemul rutier din cadrul Ansamblului Urban Arad**	Constructor
5.2.1	Predare amplasament	
5.2.2	Cota fundatiei noului sistem	
5.2.3	Stratul de fundatie	
5.2.4	Stratul de baza din mixtura	
5.2.5	Stratul de uzura	
5.2.6	Semnalizare si marcaje	
5.2.7	Refacerea mediului ambiant	
5.3	**Lucrari de reabilitare utilitati conexe**	Constructor
5.3.1	***Retea canalizare***	
5.3.1.1	Sapaturi conducta principala	
5.3.1.2	Realizare pat de pozare	
5.3.1.3	Montarea conductei principale	
5.3.1.4	Montare guri de scurgere si camine	
5.3.1.5	Executarea partiala a umpluturilor	
5.3.1.6	Proba de etanseitate	
5.3.1.7	Sapaturi pentru racorduri	
5.3.1.8	Executarea racordurilor si a umpluturilor	
5.3.1.9	Executarea completa a umpluturilor	
5.3.1.10	Lucrari de legatura la conducte si racorduri	
5.3.1.11	Proba generala a conductei	
5.3.2	***Retea de alimentare cu apa***	Constructor
5.3.2.1	Sapaturi conducta principala	
5.3.2.2	Realizare pat de pozare	
5.3.2.3	Montarea conductei principale	
5.3.2.4	Montarea armaturilor (robinete, hidranti, camine, robinete de concesie, etc.)	
5.3.2.5	Executarea partiala a umpluturilor	
5.3.2.6	Proba de etanseitate	
5.3.2.7	Sapaturi pentru bransamente	
5.3.2.8	Executarea bransamentelor si a umpluturilor	
5.3.2.9	Spalare, dezinfectare, analize	
5.3.2.10	Executarea completa a umpluturilor	
5.3.2.11	Lucrari de legatura la conducte si bransamente	
5.3.2.12	Proba generala a conductei	
5.3.2.13	Receptia lucrarii	
5.4	**Lucrari de restaurare si consolidare a Cladirii Preparandiei**	Constructor
5.4.1	Lucrari de consolidare	
5.4.2	Lucrari de instalatii	
5.4.3	Lucrari de restaurare	
5.4.4	Lucrari montaj echipamente	
5.4.5	Lucrari amenajare curte interioara	
6.	**Supervizare si asistenta tehnica**	Consultant
7.	**Auditul proiectului**	
7.1	Organizare procedurilor de achizitii pentru atribuire contract audit financiar	Resp. achizitii publice
7.2	Intocmirea raportului de audit	Auditor
8.	**Managementul proiectului**	UIP
8.1	Raportare	Manager de proiect Resp. tehnic Resp. financiar
8.2	Arhivare	Asistent Consilier financiar
8.3	Evidenta contabila distincta	Ofiter financiar, Consilier financiar, Asistent Consilier financiar
8.4	Graficul de depunere a notificării cererii de prefinantare si depunerea cererii de finantare	
8.5	Graficul de depunere a cererilor de rambursare	
8.6	Coordonare proiect, comunicare, intalniri	UIP
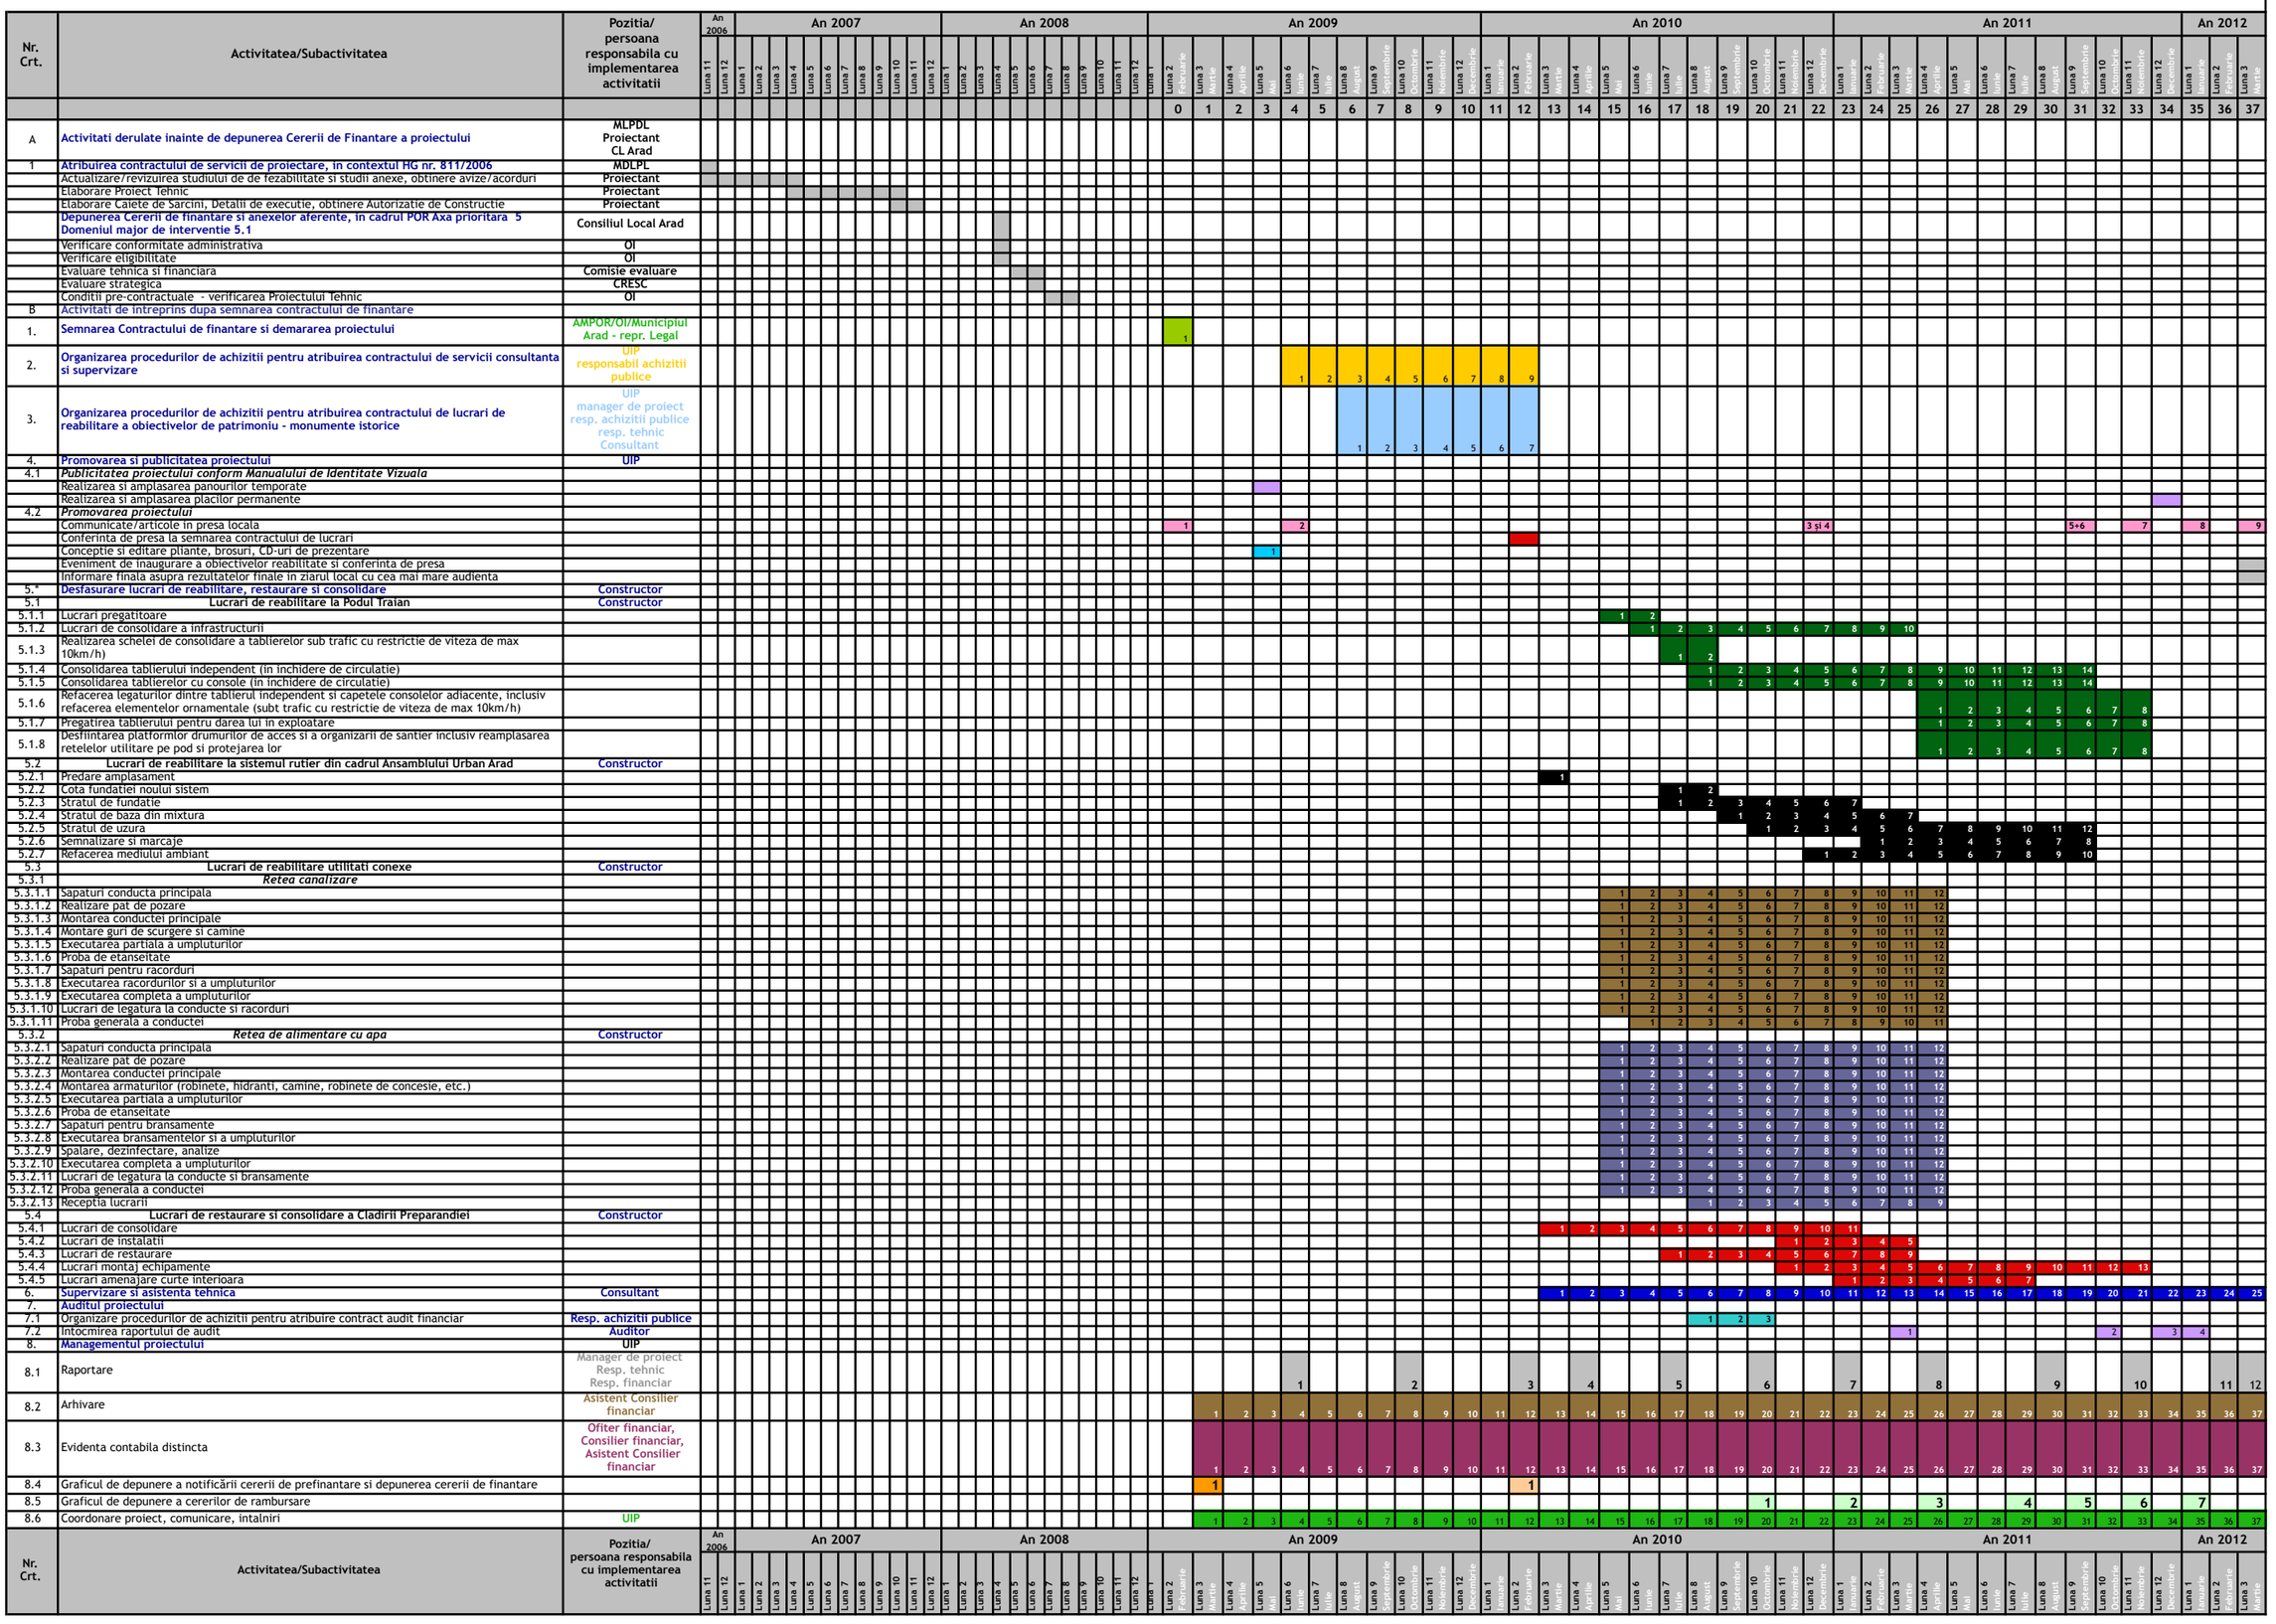
Nr. Crt. | Activitatea/Subactivitatea | Pozitia/ persoana responsabila cu implementarea activitatii
